


LAPORAN KURVA S PROJECT

Monitoring & Analisis Progress Proyek

GRAFIK KURVA S

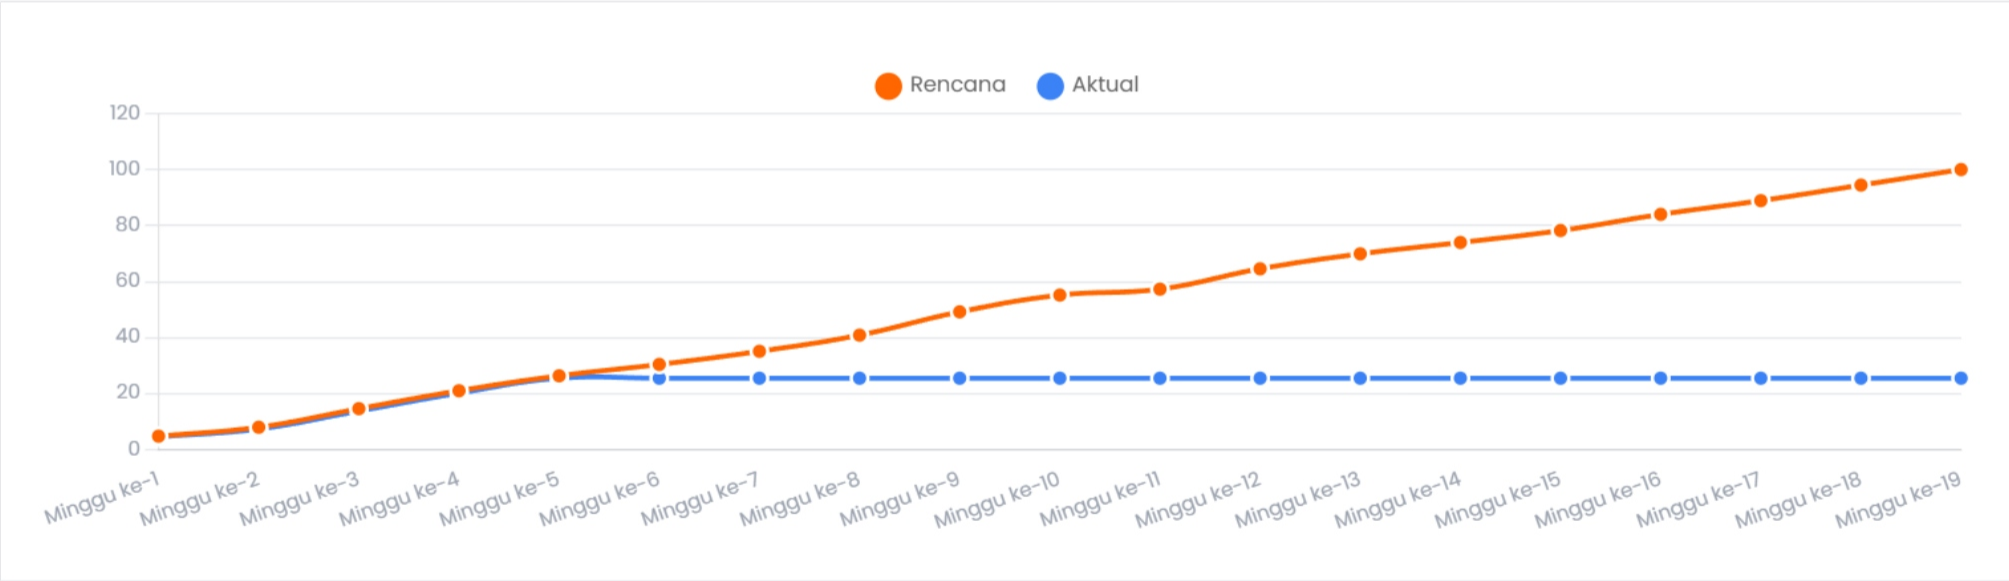

INFORMASI PROYEK

Program	Pembangunan Talud Permukiman Manadioli Kab Halsel
Kegiatan	Pembangunan Talud Permukiman Manadioli Kab Halsel

RINGKASAN PROGRESS

Sisa Minggu	0 Minggu
-------------	----------

Kode Tender	10073592000
Tanggal Mulai	01 Agustus 2025 pukul 07.00
Tanggal Selesai	06 Desember 2025 pukul 07.00

Progress Rencana	100%
Progress Aktual	25.5%
Deviasi	-74.5%
Status	Tertinggal dari Rencana

DATA KURVA S

Minggu	Rencana	Aktual
1	23.00	22.00
2	38.00	35.00
3	69.00	65.00
4	99.00	95.00
5	124.00	120.00
6	143.00	120.00
7	165.00	120.00
8	192.00	120.00

