LAPORAN KURVA S PROJECT

Monitoring & Analisis Progress Proyek

GRAFIK KURVA S

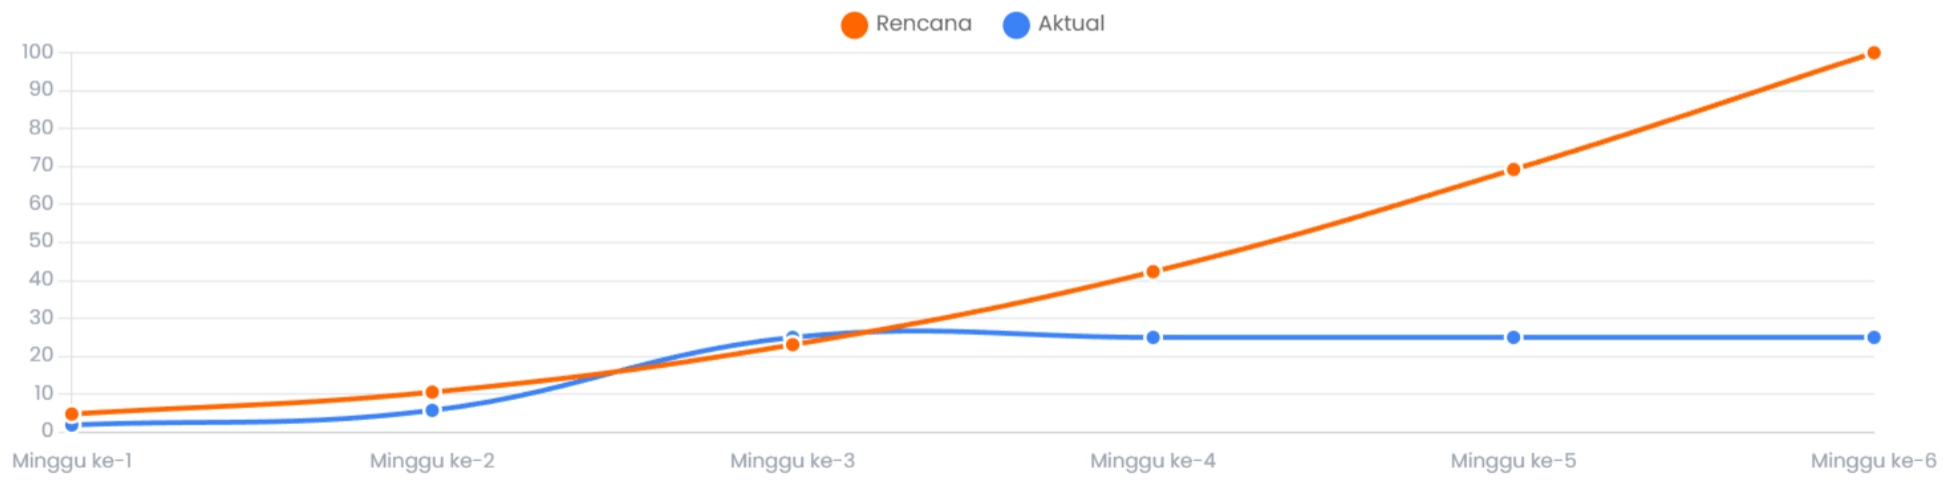

INFORMASI PROYEK

Program	Pembangunan
Kegiatan	Pembangunan Sarana Olahraga ASN I Sofifi (Lanjutan)

RINGKASAN PROGRESS

Sisa Minggu	**0** Minggu

Kode Tender	10042759000
Tanggal Mulai	23 Desember 2025 pukul 07.00
Tanggal Selesai	02 Februari 2026 pukul 07.00

Progress Rencana	**100%**
Progress Aktual	**25%**
Deviasi	**-75.0%**
Status	**Tertinggal dari Rencana**

DATA KURVA S

Minggu	Rencana	Aktual
1	25.00	10.00
2	55.00	30.00
3	120.00	130.00
4	220.00	130.00
5	360.00	130.00
6	520.00	130.00
